



CURSO TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO



PROFESSOR (A):

**Jorge Augusto
Costa**



CONTEÚDO:

**Gestão do Tempo:
Cronograma do Projeto**



DATA:

24/08/2020



Gráfico de Gantt: data cedo



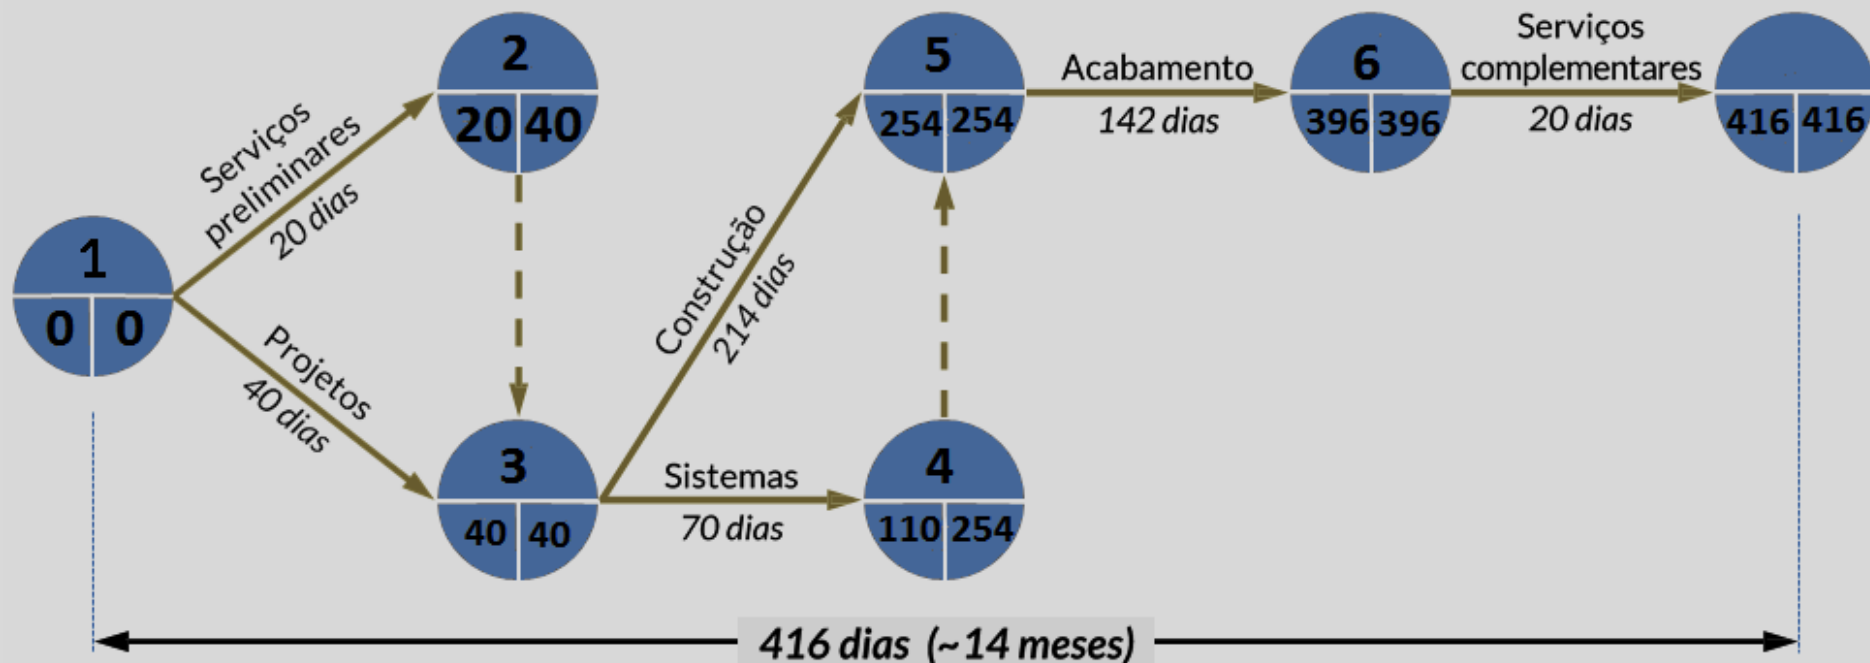




Gráfico de Gantt: data tarde

Serviços preliminares	20				
Projeto	40				
Construção		214			
Sistemas			70		
Acabamento				142	
Serviços complementares					20

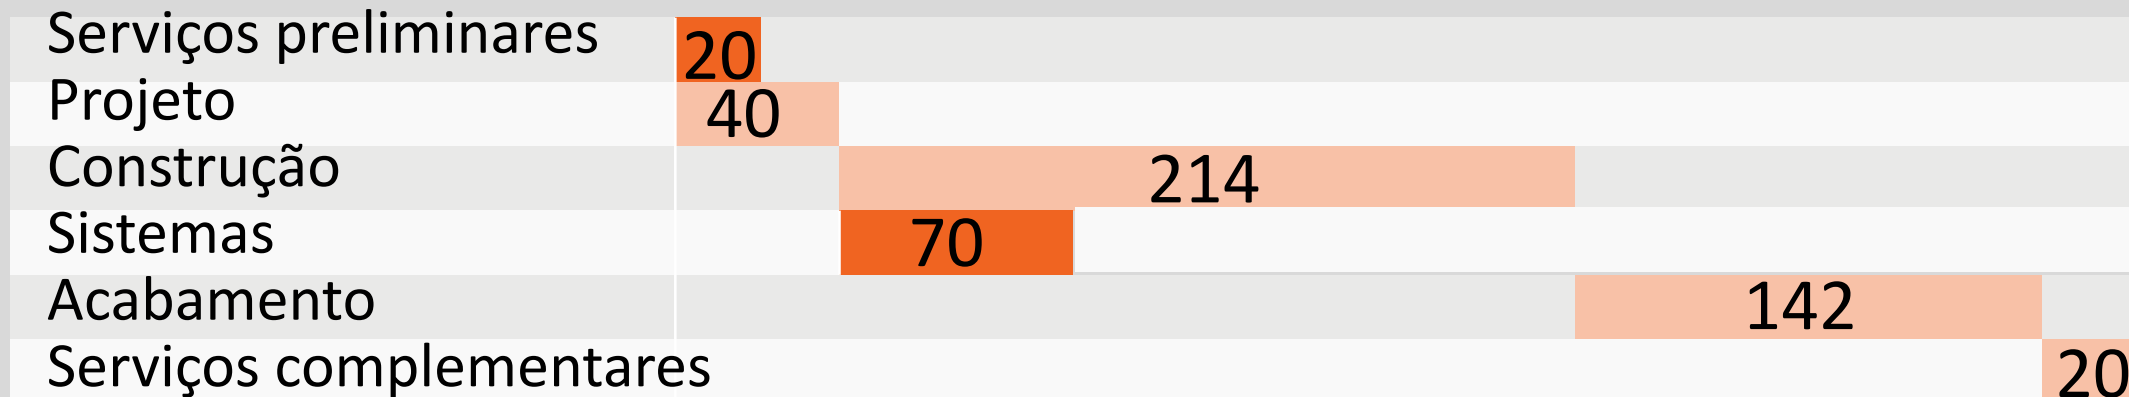

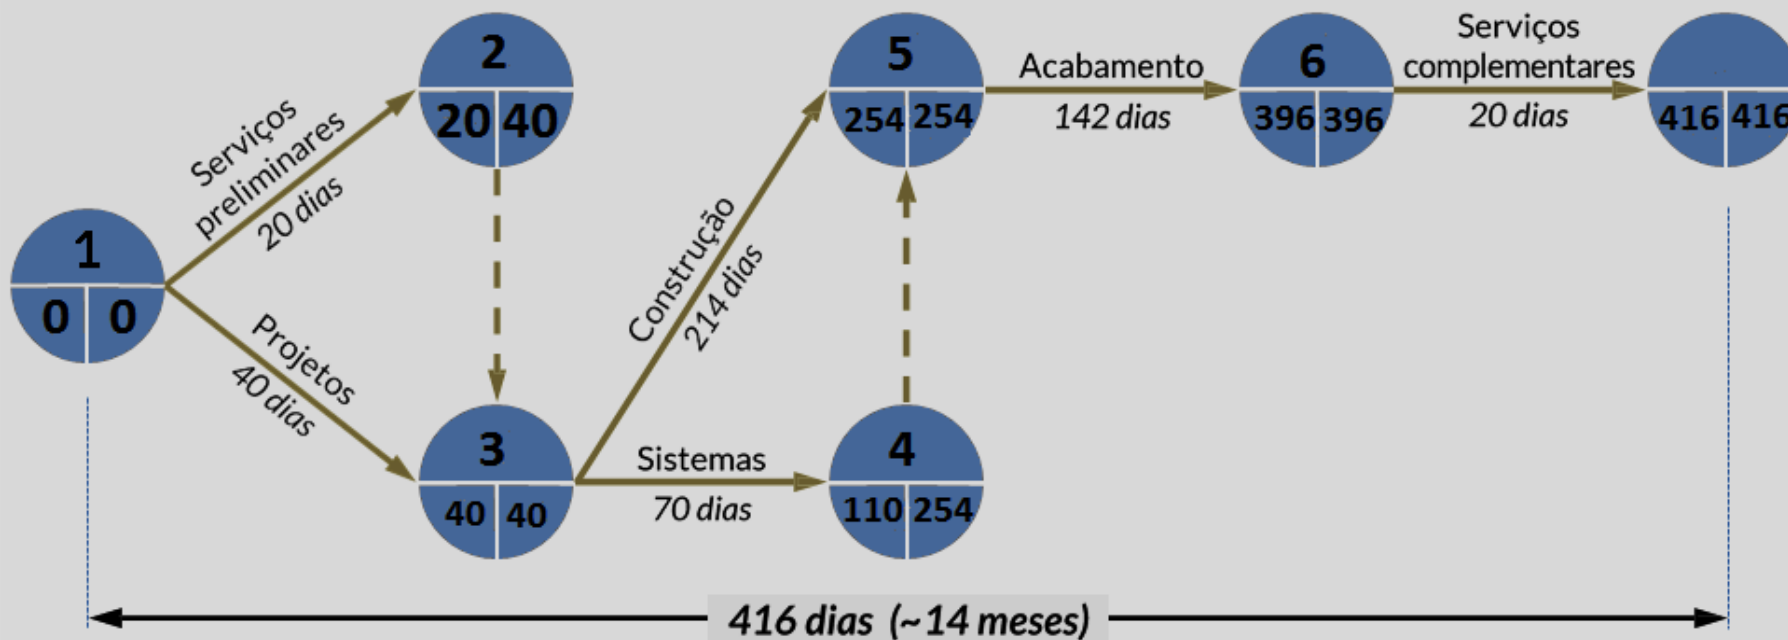

GERT - Graphical Evaluation and Review Technique

Método do diagrama condicional (Conditional Diagramming Method – CDM):

Graphical Evaluation and Review Technique(**GERT**)

Modelos de sistemas dinâmicos (System Dynamics)

Loops: teste que deve ser repetido mais de uma vez

Desvios condicionados: atualização de um desenho que é necessária apenas se a inspeção detectar erros

Diferente do PDM e ADM, essas técnicas permitem loops ou ramos condicionais



GERT: diagrama condicional

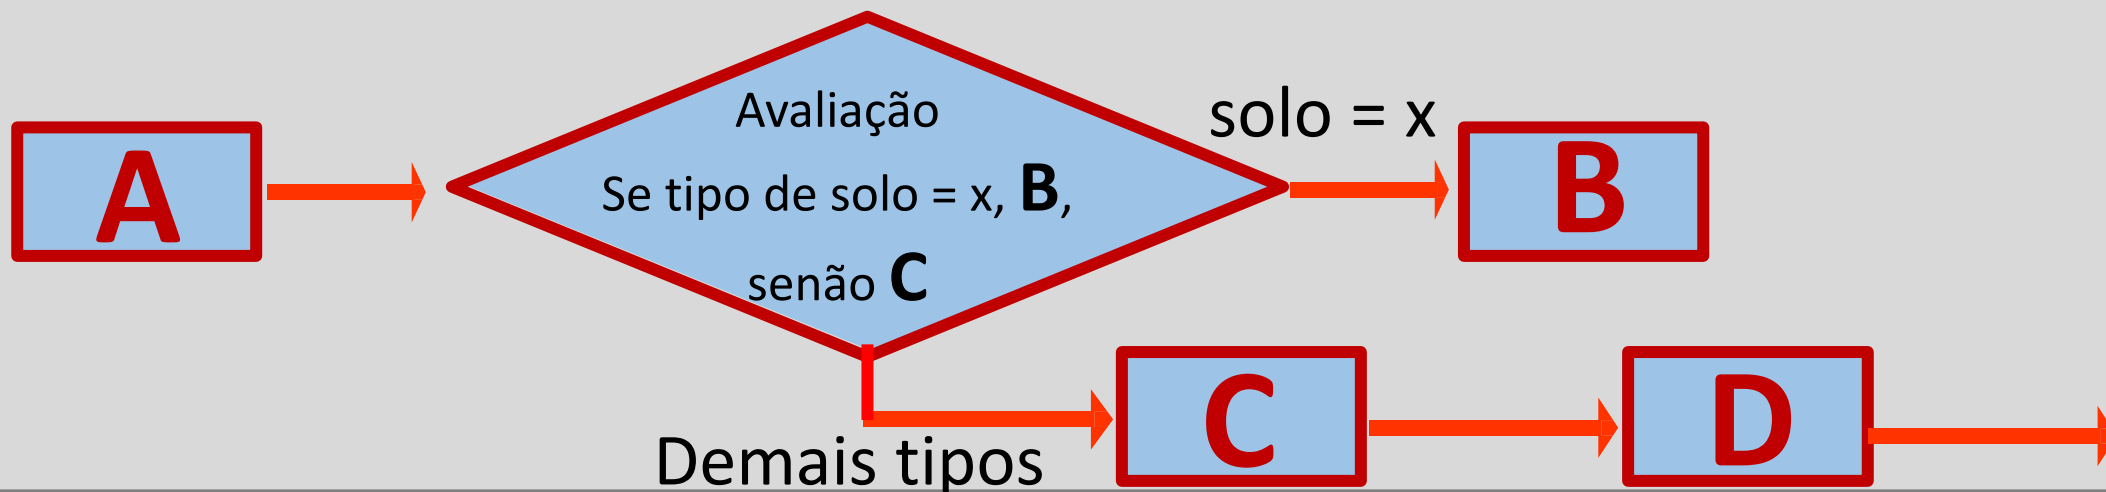
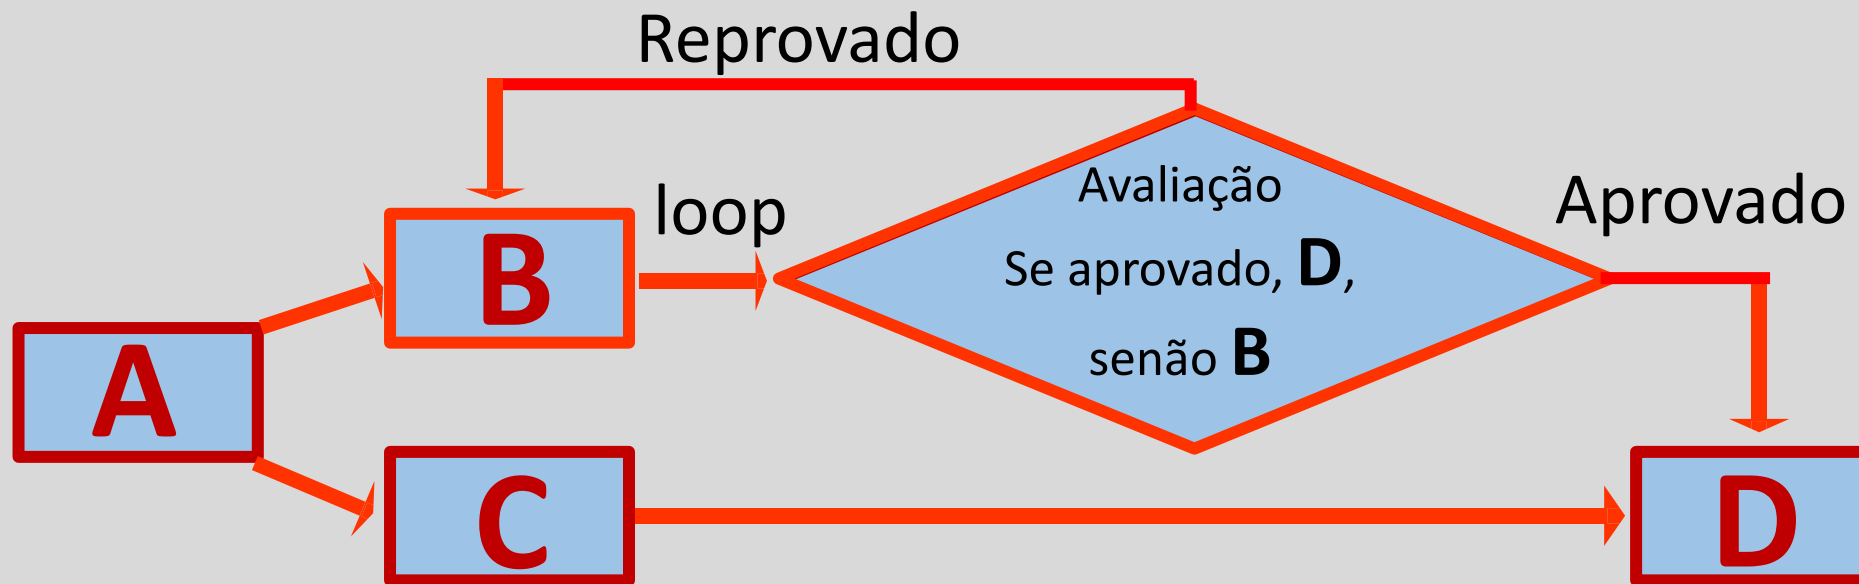




Diagrama de marcos

△ Planejado
▼ Realizado

Data atual

Evento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Subcontratos assinados			△	▼				
Especificações finalizadas				△				
Projeto revisto					△			
Subsistema testado						△		
Primeira unidade entregue							△	
Plano de produção completado								△

Existem muitas outras formas de se apresentar informações do projeto num diagrama de Marcos
